

## RELATÓRIO TÉCNICO

Nº 03/03

DOCUMENTO: Contrato 134/2023 – Processo Administrativo Nº 4746/2023 –

DATA: 01/05/2024

ASSUNTO: Atendimento ao Termo de Referência do Contrato.

Versa o presente parecer sobre a solicitação exarada em 01/05/2024, sobre o atendimento da solicitação do Serviço Autônomo de água do Município de Santo Antônio de Pádua, para atendimento ao Contrato 134/2023, primeiro termo de aditivo, em seu Termo de Referência relativo ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024 ao que tange as principais ações desenvolvidas por essa Companhia:

- Realizamos neste mês 54 reparos de vazamentos de rede.




Figura 1: Reparo de vazamento de rede no Bairro Arraialzinho

- Foram realizados 46 reparos de vazamentos de ramal.



**Figura 2: Reparo de vazamento de ramal na Av.Souza**

- Foram executadas 17 novas ligações neste mês de abril.

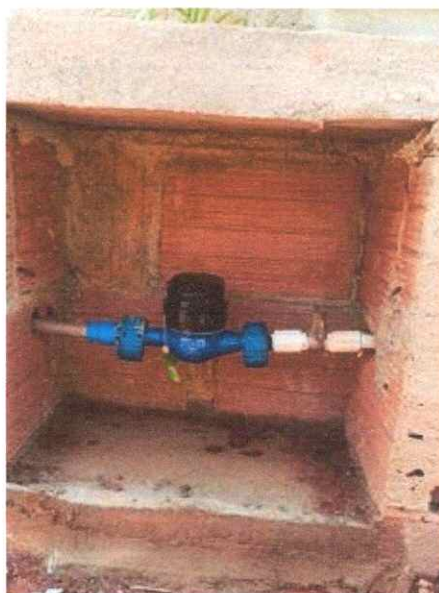

**Figura 3: Instalação de HD para ligação nova**



- Foram realizados 354 cortes de cavalete, ou seja, interrupção no abastecimento por falta de pagamento. Além destes, realizamos 15 cortes de ramal e 50 cortes com retirada do hidrômetro.



Figura 4: Hidrômetro com abastecimento interrompido por falta de pgto.



Em contrapartida aos cortes, foram realizadas 343 religações de cavalete, 10 religações de ramal e 12 religações de ligação cancelada. Dentre os demais serviços realizados, segue abaixo o quantitativo:

Realizamos 5 deslocamentos de cavaletes, 27 estudos de viabilidade para ligação nova, 17 verificações de reclamação de falta d'água, 286 manutenções eletromecânicas e 10 retiradas de ligações clandestinas.

- Dando continuidade na obra de construção da Estação Pressurizadora de água Tratada (EPAT), localizada na Praça do Obelisco, estamos na fase de acabamento da cobertura e em breve estaremos iniciando o processo de interligação da rede de abastecimento, instalações eletromecânicas e pintura do local.



**Figura 5: Instalação de telhas da cobertura**




**Figura 6: Instalação de aduela de porta**





Figura 7: Execução de pintura para acabamento do telhado

É o que temos a relatar.



FORTALEZA AMBIENTAL  
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA  
*Rômulo França*  
Engenheiro

**Rômulo França da Cunha**  
Gerente Operacional  
Engenheiro Civil  
CREA – RJ 2017122338
